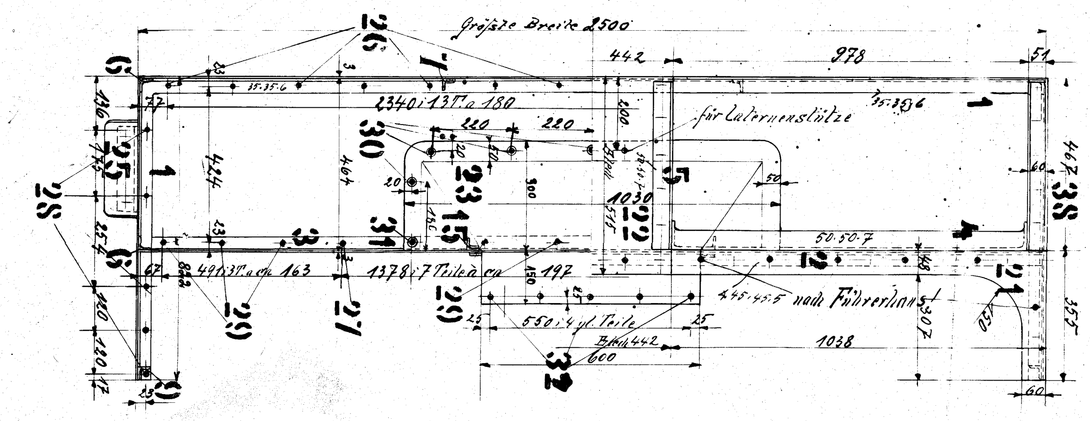

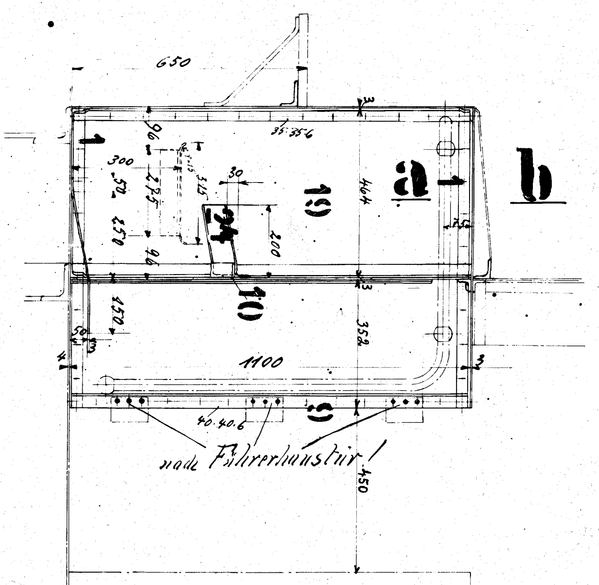

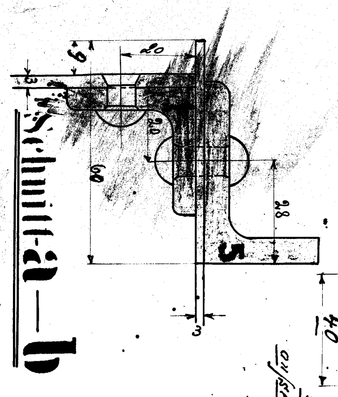







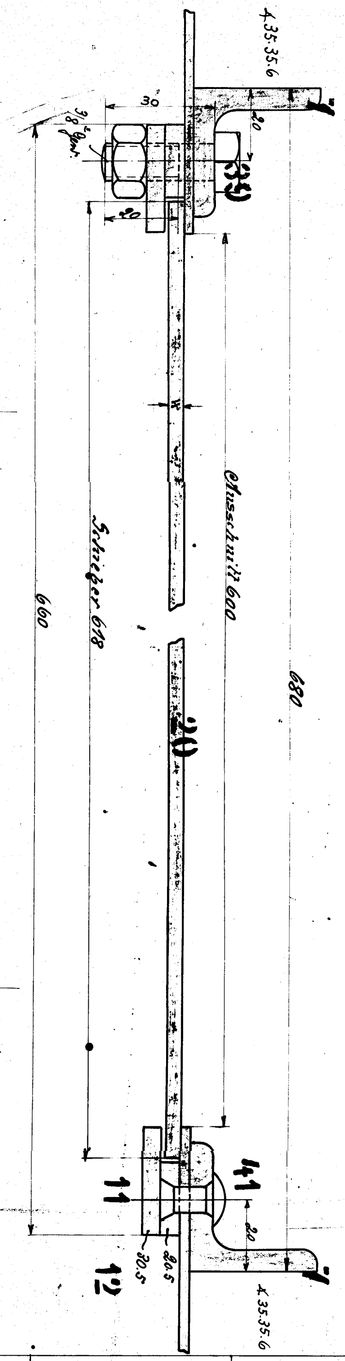

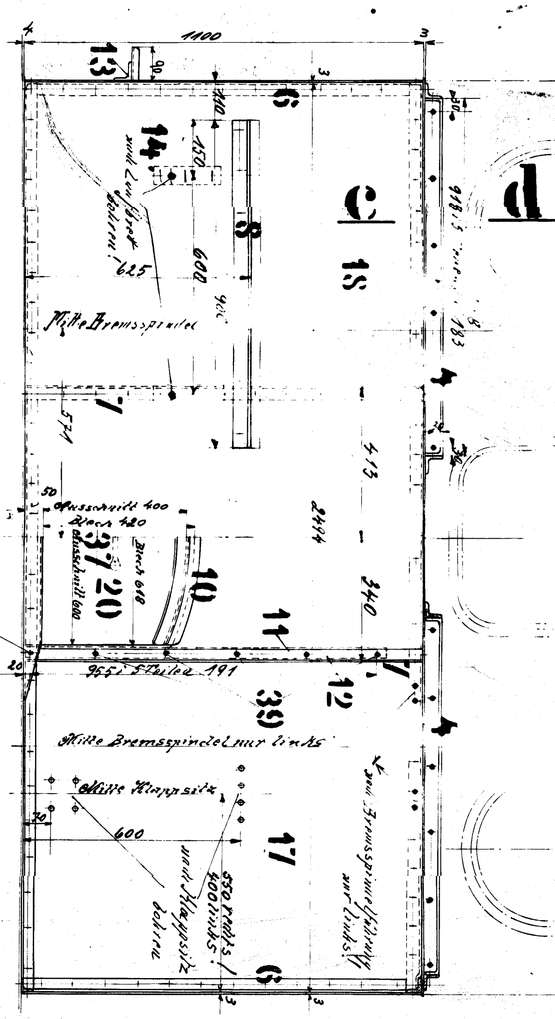

Stückliste

Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung
1	17	Fl E	Vorderwand	2505.1105.3 ausw. bestellt!
1	18	"	Hinterwand	2505.1105.3 " "
2	19	"	Seitenwände	1105.830.3 " "
1	20	"	Schieber	625.420.4 " "
2	21	"	Versteifungen (1 Blech)	1110.365.3 " "
1	22	"	Deckblech	520.445.3 " "
1	23	"	Schippblech	1050.470.3 " "
1	24	"	Schirmblech	660.210.4 " "
2	25	" I	Fußtrittbleche (Riffelblech)	335.90.5½ v.L.
44	26	Rd	Muttenschrauben	½" .40 lg bearb.
2	27	"	"	½ " .35 " "
10	28	"	"	½ " .30 " "
10	29	"	"	½ " .25 " "
7	30	"	" m. vers. Kopf	⅜" .20 " "
2	31	"	" " "	⅜ " .25 " "
5	32	Fl E	Holzschrauben	m. vers. Kopf v.L.
1	33	"	Haken	
1	34	"	Ringe	
1	35	"	Kette	550 lg v.L.
1	36	"	Öse	
1	37	"	Handgriff	v. N.B. 51/108 v.L.
2	38	Fm	Blechstreifen	467.60.3 " "
10	39	Fl E	Muttenschrauben	⅜" .30 lg bearb. " "
2	40	"	"	⅜ .35 " " "
ca 400	41	SE	Niete	7φ versth. lg " "
	42			
	43			
	44			
	45			

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr.	Auftr.	Auftr.
Führerhaus	64224 64281		
Rahmen	395/178 64/995		
Winkel z. Kohlenkasten	396/409		
Führerhaustür	375/42		
Laufbrett	90/648		
Handstangen	84/747		
Klappen u. Beschläge	87/280		
Klappsitz	387/107		
Führung z. Bremsspindel	391/675		
Laternenstütze	85/641		

Berechnungs-Karte Nr. — gez. 23/1 — Gepr. — Gen. — Friedrich

Auftrag Besteller Aufgabe Datum

64224 Ringshofen 7744/48 3 mal 7" } Schr. u. Muttern nach dies. Tabelle! } aufgegeben 8.4.11 Gr
64981 Ry.-mgrgard 4905/07 3 mal 7"

Auftrag Besteller Aufgabe Datum

Kohlenkasten.

Maßstab 1:10 1:20

A. BORSIG BERLIN-TEGEL

395
191
