Stückliste

II Stck.	I Stck.	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung
1	1	1	Div.	Kesselmanometer	Kompl. auswärts bestellt.
2	2	2	K.	Bordscheiben	3 m/m stark.
1	1	3	"	Röhrchen	7/10 ∅, Länge bei Montage bestimmen.
1	1	4	Fl.E.	Halter	aus Fl.E. 60×20
1	1	5	" "	Unterlage	6 m/m Blech 80×80.
6	2	6	" "	Mutterschr. m. halbrund. Kopf	1/2"×32 lg. u.d.
4	4	7	" "	Niete	8∅
1	1	8	..	Stift	A.E. 26∅×60 lg.

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr. 61192	Auftr.	Auftr.	Auftr.
Manometerhahn	85/511			
Führerhaus	55/536			

Schlüsseltabelle

Stück	Nummer
1	1/2"
1	Schl.w. 44
1	Schl.w. 52

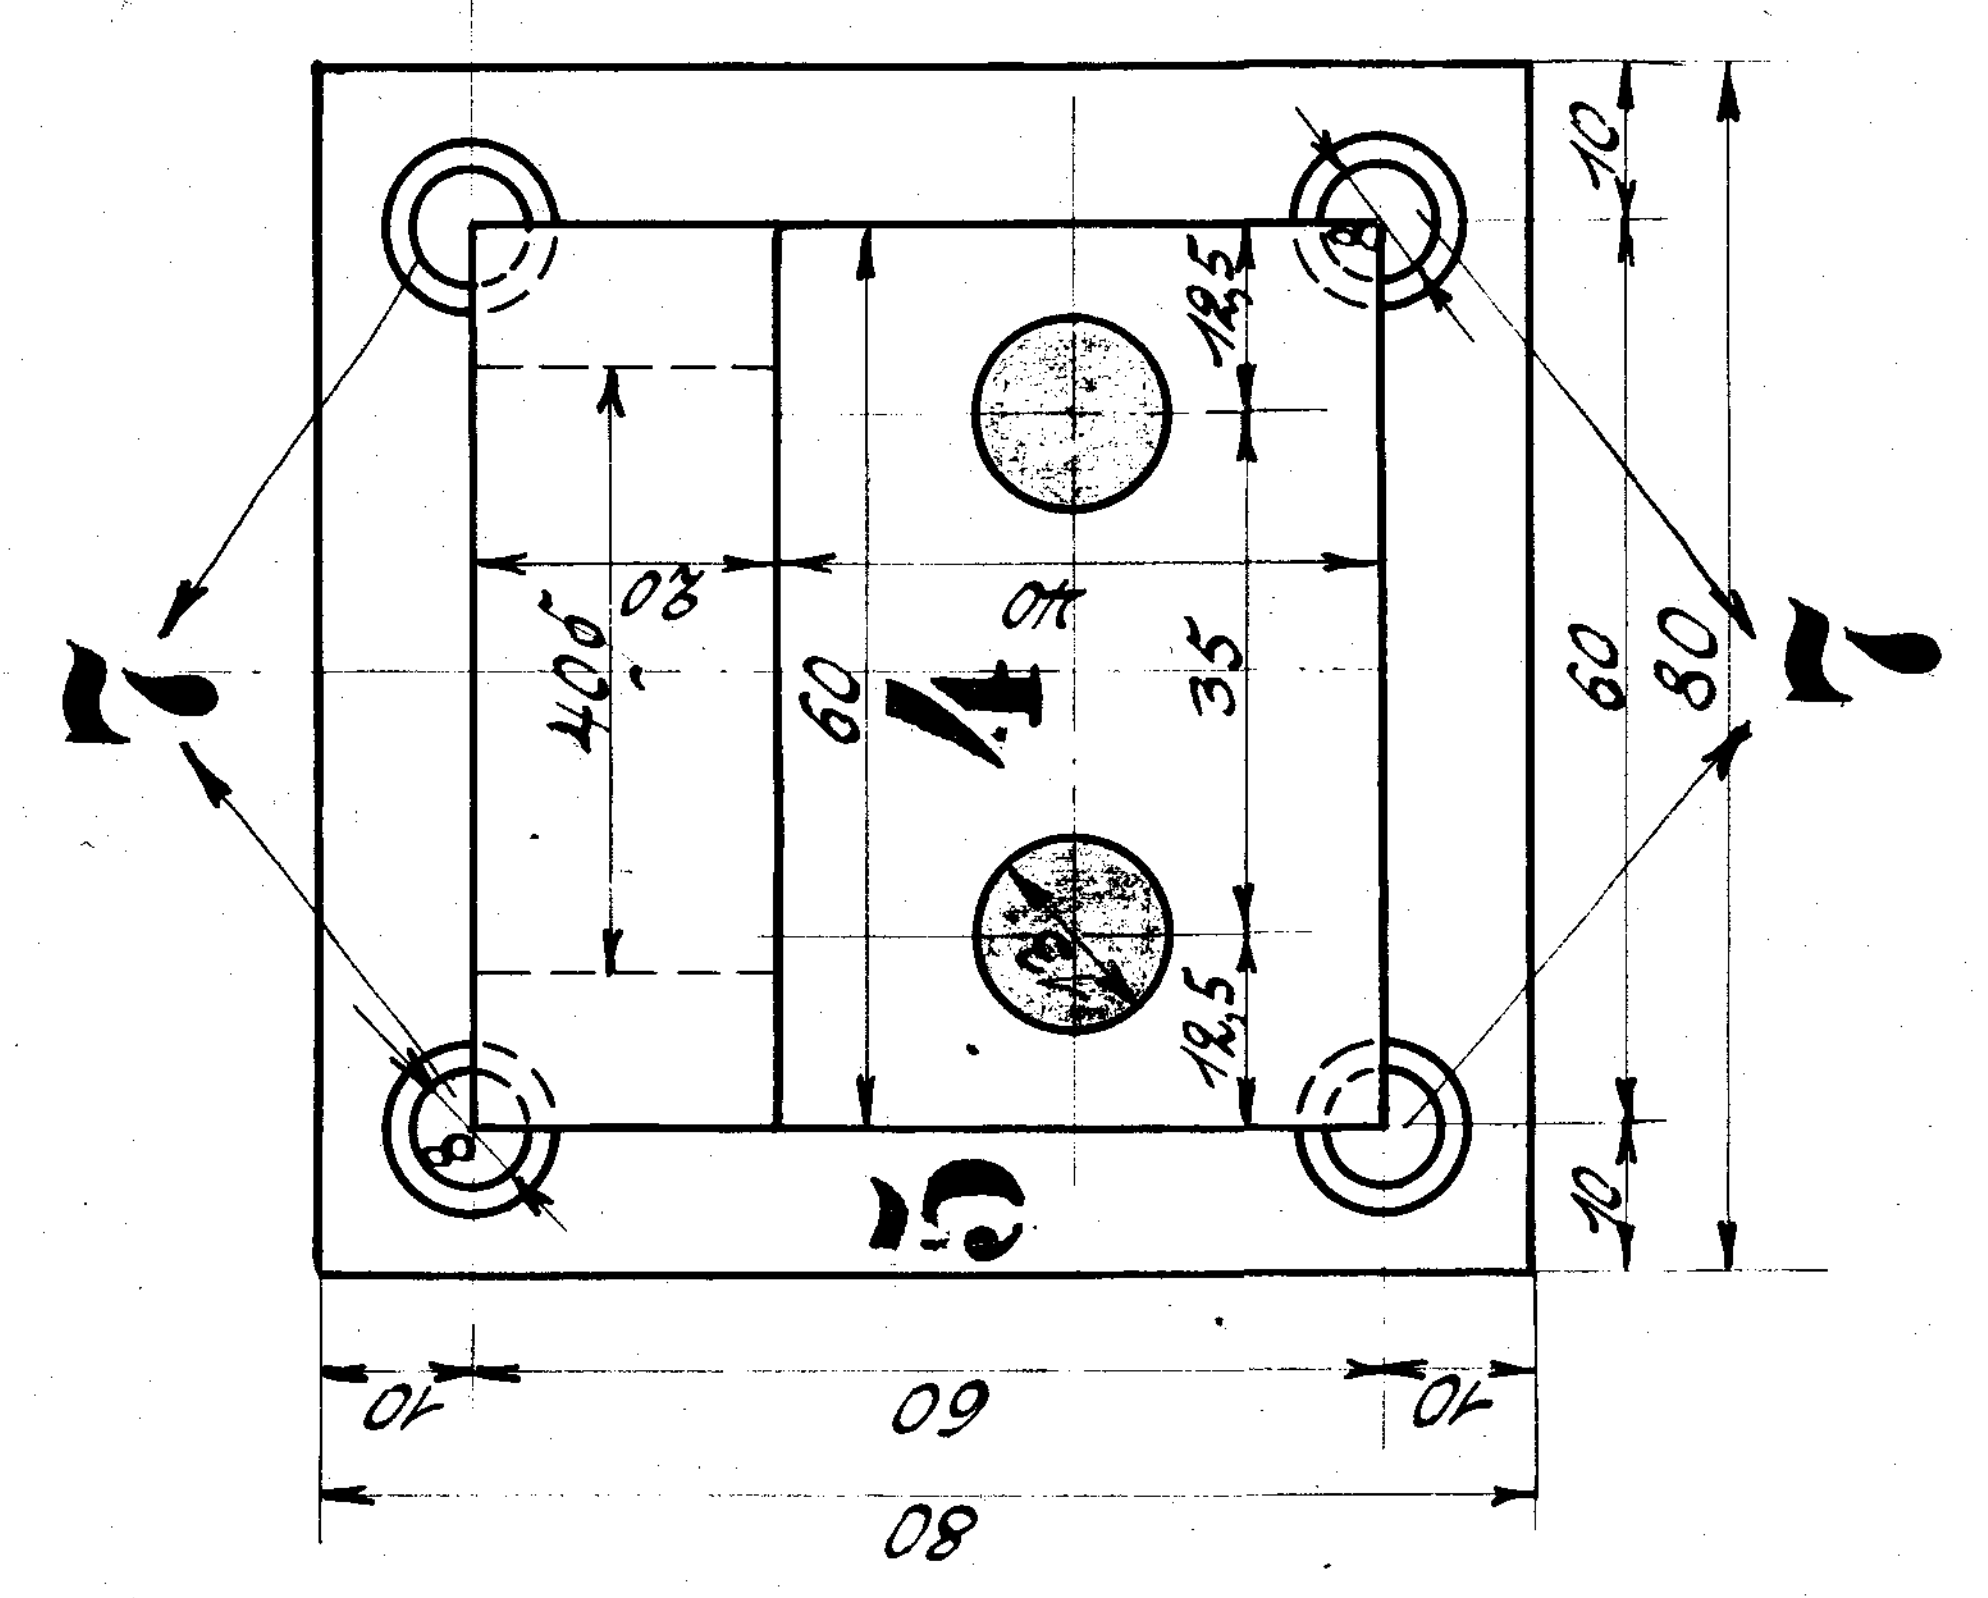

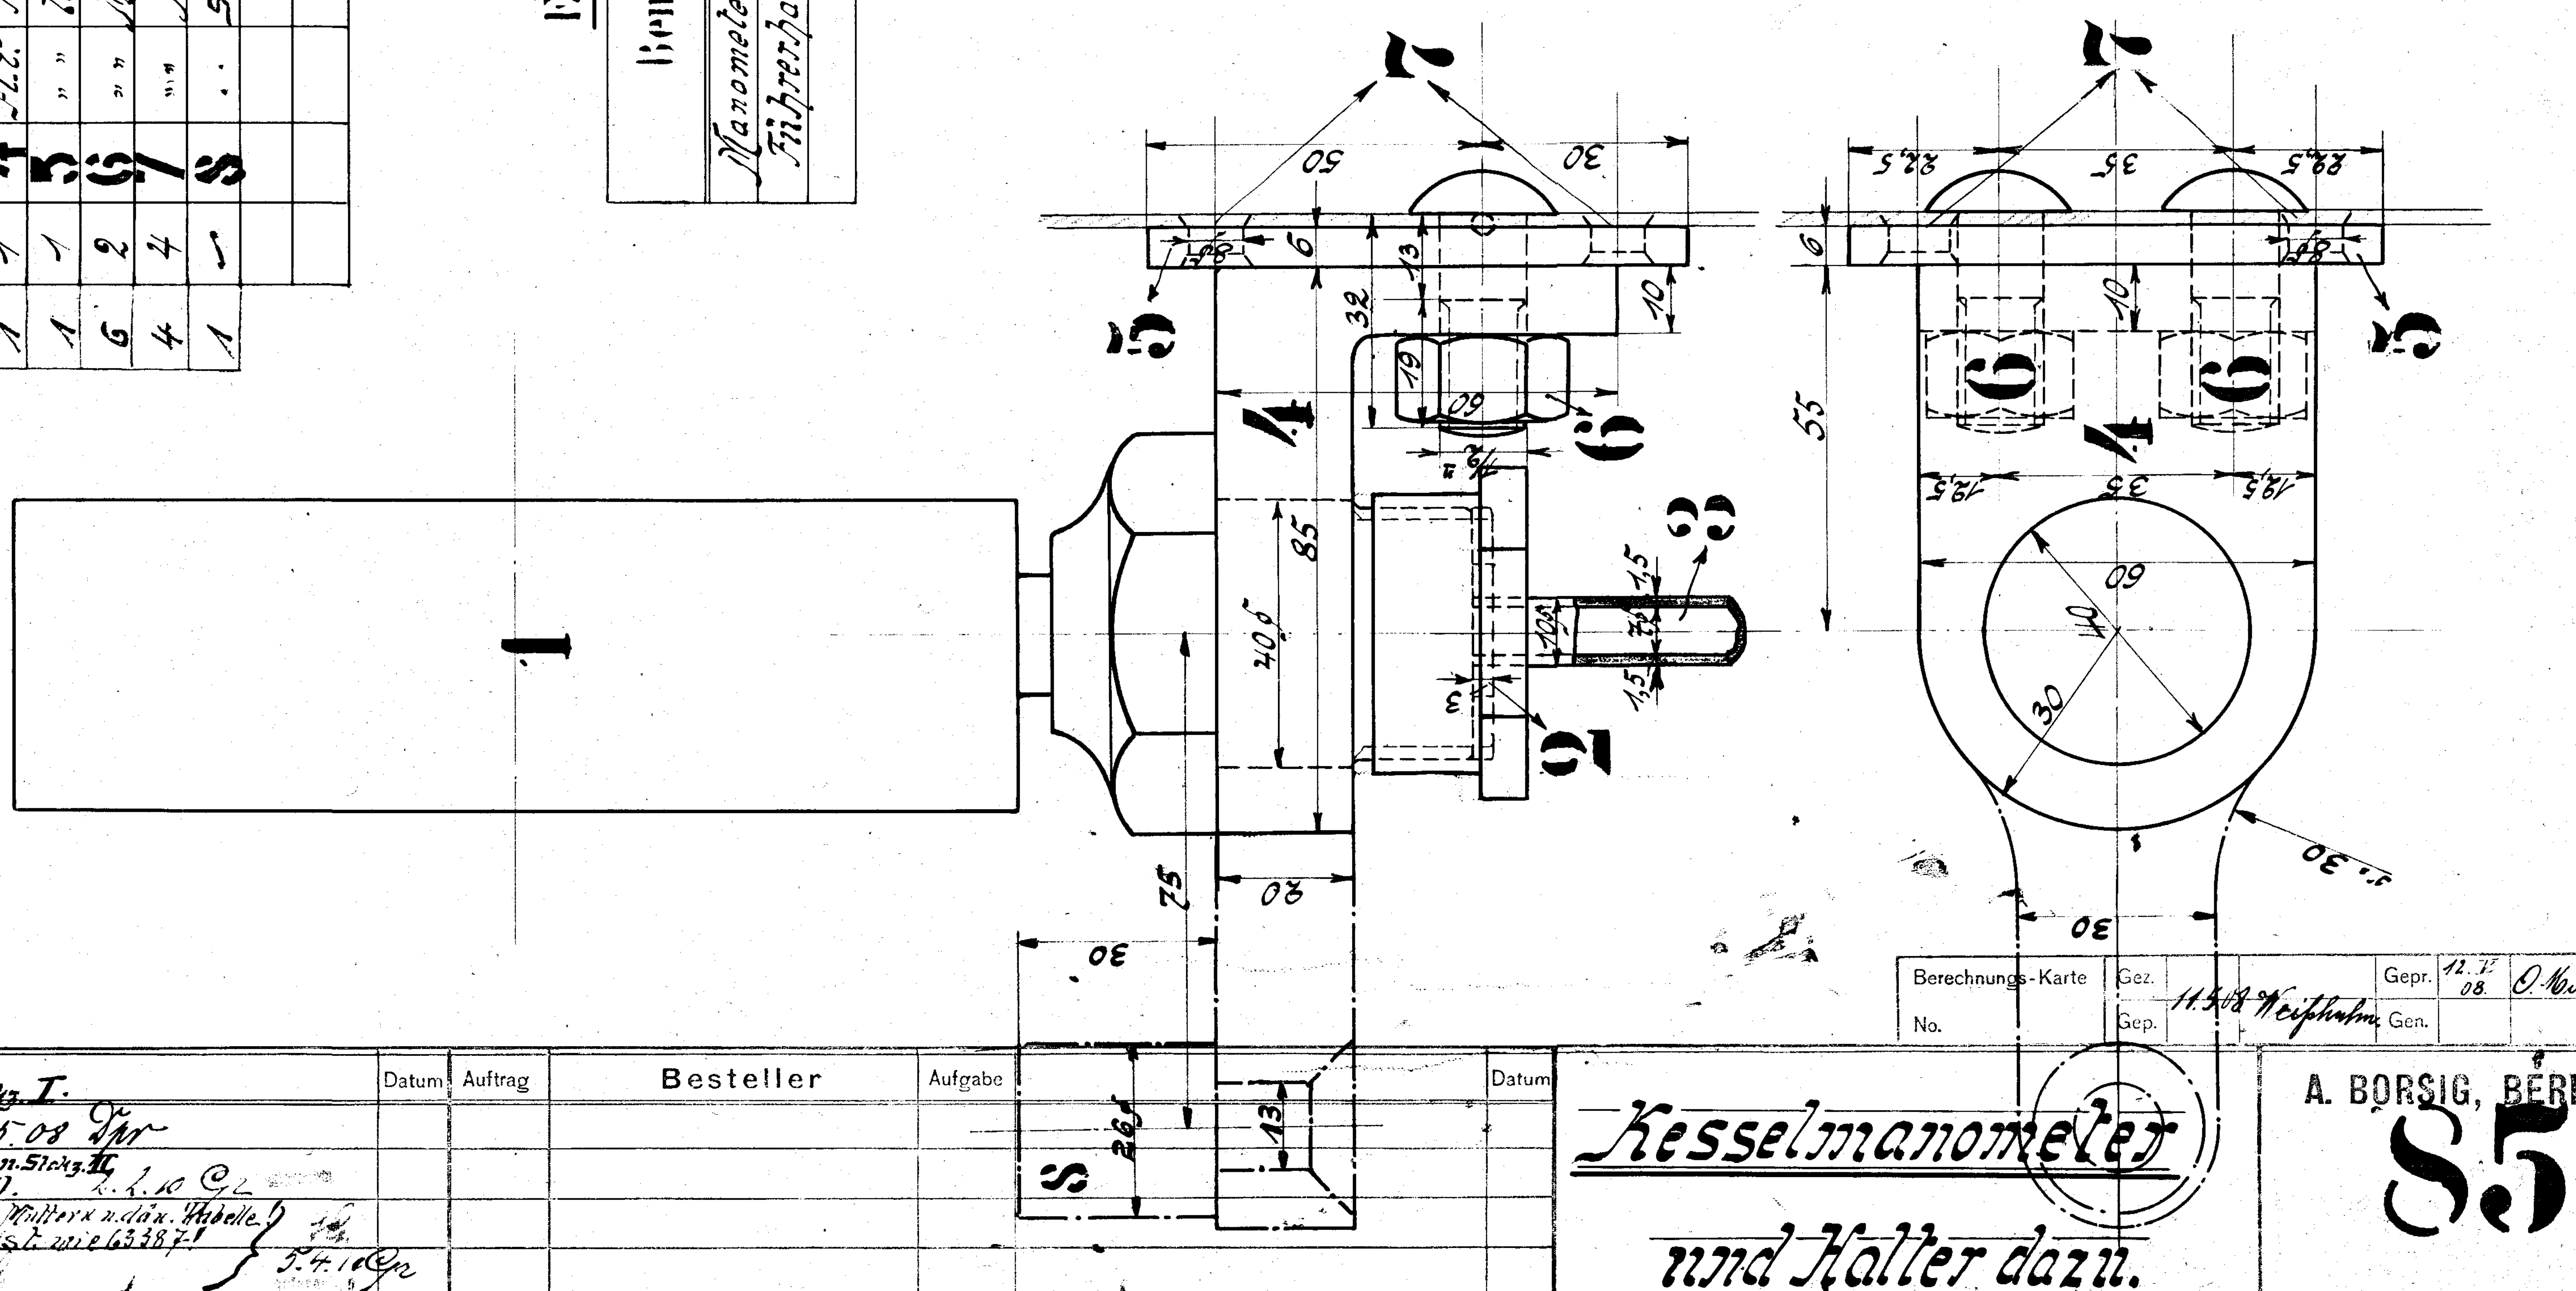

Auftrag	Besteller Lok No	Aufgabe		Datum	Auftrag	Besteller	Aufgabe	Datum
61192	Nordfyenske 6866	1mal	n. Stckz. I. 12.5.08					
63387	Hammel-Aarhus	1mal	nach Skizze n. Stckz. II 7410 2.1.10					
64224	Ringkjöbing 77 16/18	3mal	Schr. u. Muttern n. dän. Tabelle sonst wie 63387! 5.4.10					
64981	Ryomgaard 7405/07	3mal						

Berechnungs-Karte No.	Gez. 11.5.08 Weifsbahn	Gepr. 12.V.08 O. Müller	Gen.

Kesselmanometer und Halter dazu.

Mafsstab 1:1

A. BORSIG, BERLIN.

85

737
